




PURPLE LOTUS TEMPLE

目前進度

真佛宗紫蓮堂

歷年來對籌建紫蓮雷藏的大力護持。由於你的發心，讓紫蓮雷藏寺籌備過程中的種種困難得以順利進行。

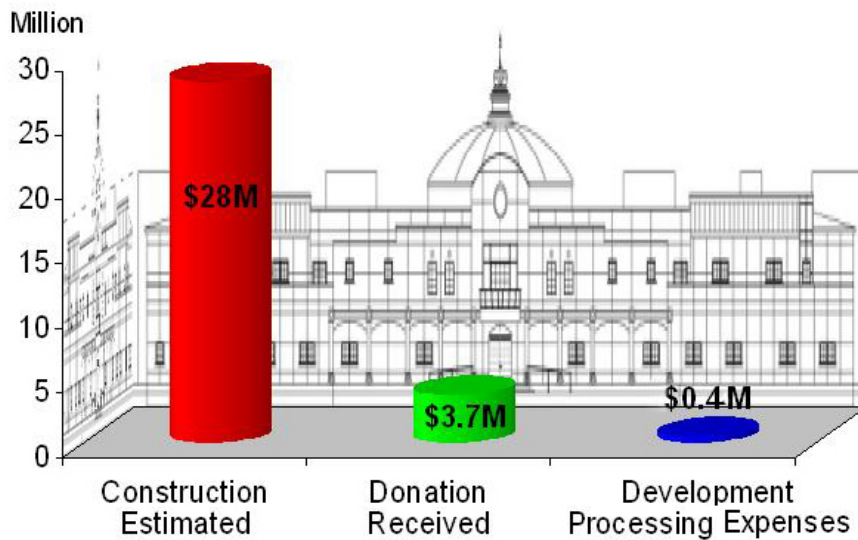

如您所知，要想在美國加州黃金地段、超高價位的佛利滿市 (Fremont)，在約五點五英畝的空地上，開發為一座將近十萬平方呎的全新寺廟和學校，是一項多麼艱巨挑戰的工程計劃啊！而這整個工程計劃完成預估將耗資美金兩千八百萬 (2006年的評估)。

雷藏寺和學校的建地位於佛利滿市州立公園旁，也正好是與聯合市交界之處，因此，必須取得兩市的政府、州立區域公園局、以及途經之灣區捷運系統和南太平洋鐵路局的同意，才得以邁向建寺之路。

建



地

而這塊建地是從未開發過的空地，因此所有的公共設施如：自來水、污水處理、下水道、電力和瓦斯系統，都必須全新安裝。此外，還面臨了兩市的政治問題和市府內部多方面的人事及建築物法規的變動，致使工程計劃的核准過程比尋常案件更為長久！

紫蓮雷藏寺

PURPLE LOTUS TEMPLE



PURPLE LOTUS TEMPLE

BUILDING PERMIT PROGRESS



- ★ 5/2/1999: 前往西雅圖祈請師尊做紅財神護摩求紫蓮雷藏寺寺地。
- 7/16/1999: 購下位於佛利滿市(Fremont)公園旁邊5英畝地，隨即開始籌劃建廟事宜。
- 10/15/2000-09/04/2001: 麗惠上師與蓮洋法師、周師兄、法師、同門等，持續進行「寺圖草稿」討論，並決定大致構圖。
- ★ 5/31/2002: 佛利滿市政府通過初步審核建廟計劃。
- 7/10/2002: 真佛宗委會通過籌款建廟。
- 8/1/2003: 佛利滿市政府通知建廟必須有以下的評估報告 (1)交通評估，(2)噪音評估，(3)野生動物評估，(4)環境評估。同時必須得到 (1)灣區捷運系統，(2)聯合市市政府，及 (3)Alameda縣公園管理局的同意。
- 12/20/2004: 完成1)交通評估，(2)噪音評估，(3)野生動物評估。
- 9/7/2005: 聯合市市政府發函要求一百萬元道路費，否則不同意建廟。
- 4/25/2006: 聯合市市政府通過有條件支持建廟，同時取消一百萬元道路費的要求。
- 5/18/2006: 至此，經過四年來不斷的努力，初步符合佛利滿市政府的條件，終於開始雷藏寺設計圖的修改。
- ★ 6/8/2006: 建築設計圖樣獲得佛利滿市都市計劃委員會核准。
- ★ 6/29/2006: 取得佛利滿市議會許可，將雷藏寺建地由五塊地變更為一整塊建築用地。
- 9/15/2006: 建築工程專業小組正式組織完成，以因應建築、土木、水、電氣、庭園設計、空調、土壤和結構等工程之需要。
- 11/13/2006: 由紫蓮堂行政管理組、眾位同門和專業顧問等完成綜合性的審核評估。
- 11/20/2006: 由建築工程專業小組展開進行施工圖樣之繪製。
- ★ 11/16/2007: 第一次施工圖樣送交佛利滿市建管局審核施工執照。
- 11/29/2007: 交通運輸工程師加入建築工程專家小組。
- 12/27/2007: 收到佛利滿市府第一次的施工圖樣審核評註回覆。
- 4/2/2008: 完成向佛利滿市府都市計劃委員會解說更改設計圖樣內之相關事宜。
- 4/3/2008: 建築工程專業小組依據佛利滿市府都市計劃委員會建議開始修改施工圖樣。
- 5/16/2008: 根據修改之施工圖樣和市府第一次審核評註，建築工程專業小組開始修改所有建築施工圖樣。
- 6/3/2008: 根據修改之施工圖樣，由建築工程專家小組提供預估成本和工程完成期限。
- 8/14/2008: 建築物法規研究專人加入建築工程專業小組。
- ★ 9/4/2008: 將所有依據2001年加州建築物法規的施工圖樣，更改調整以附合2007年加州新建築法規。
- 2/5/2009: 送交依佛利滿市府第一次審核評註而修改完成的施工圖樣。

迴向

凡發心護持蓮花童子娑婆道場
「紫蓮雷藏寺」者，皆得
福慧增長，平安如意，修持有成，吉祥圓滿。
